
План котлована

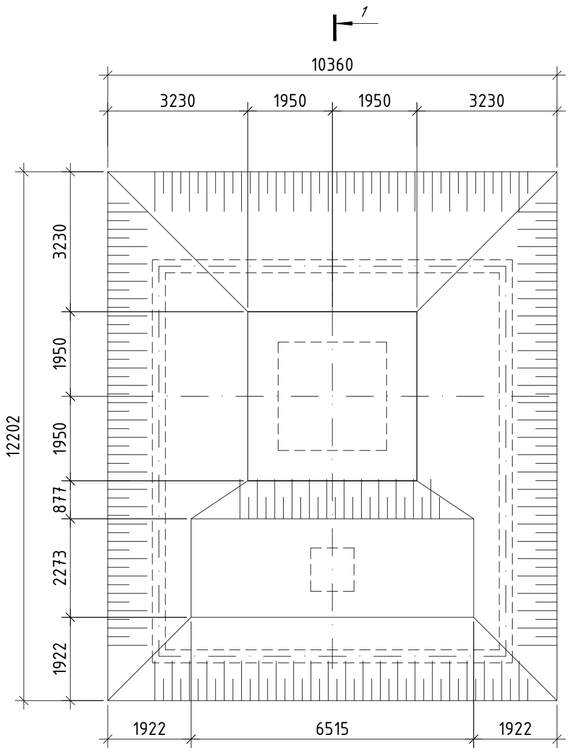

1 - 1

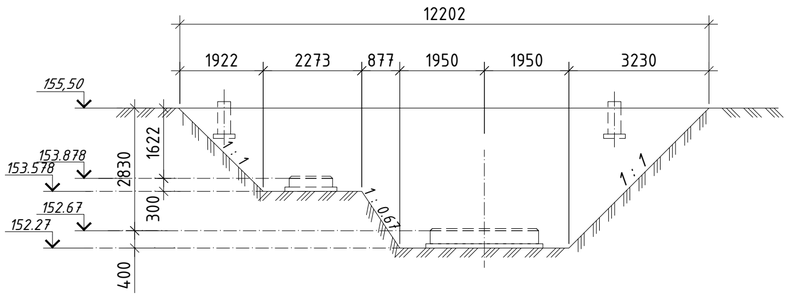


Таблица объемов земляных работ

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Выемка грунта	$м^3$	275.78	
2	Обратная засыпка	$м^3$	262.35	
3	Лишний грунт выемки для планировки по территории площадки строительства	$м^3$	13.43	

1. Порядок производства работ:

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по подготовке основания:

Срезка растительного слоя грунта толщиной min. 10см (ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ ПОЧВЫ) $\gamma_{ск}$=1,3тн/$м^3$ с перемещением грунта в отвал для последующего использования его при рекультивации. Срезку растительного слоя грунта выполнять за 1-2 прохода по одному следу при отсутствии корней кустарников и деревьев, она учтена в разделе проекта "ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА". Грунт в зависимости от трудности разработки механизированным способом - I-й группы согласно дополнения к ШНК 4.02.01-04 на Земляные работы.

Выемку грунта котлована выполнять механизированным способом при помощи одноковшового экскаватора с емкостью ковша 0,65$м^3$ с перемещением в отвал, учесть потери 1,5%.

Котлован должен быть освидетельствован с участием инженера-геолога с целью определения пригодности грунтов в качестве основания.

Обратную засыпку пазух котлована выполнять местным песчаным грунтом после устройства фундаментов с качественным послойным уплотнением. Высота уплотняющего слоя грунта не более 30см. по высоте, согласно ШНК 3.02.01-19 - Земляные сооружения, основания и фундаменты.

До начала производства земляных работ должен быть составлен проект производства работ, в котором решаются следующие вопросы:

- порядок разработки котлована с учетом очередности этапов строительства;
- уточненные габариты котлована, согласно данного чертежа;
- места складирования грунта для обратной засыпки;
- механизмы для разработки грунтов, для уплотнения дна котлована, грунтов обратной засыпки;
- при необходимости - порядок замачивания грунтов;
- обеспечение лабораторного контроля за качеством уплотнения грунтов;

Все работы выполнять с соблюдением требований:

- ШНК 3.01.01-22 "Организация строительного производства";
- ШНК 3.02.01-19 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
- ШНК 3.01.02-23 "Техника безопасности в строительстве".

При производстве земляных работ необходимо уточнить соответствие грунтов принятых в проекте. В случае обнаружения других грунтов сообщить об этом проектной организации для принятия соответствующих решений. А также при обнаружении под подошвой предполагаемого сооружения неоднородного грунта с включениями мусора, выбрать его на всю мощность, компенсировав выборку послойно уплотненными местными грунтами (Нсл<30см и Ку=0.95) до уровня проектной отметки дна котлована;

Общее примечание:

1. Котлован разработан в соответствии с решением по привязке объекта на генплане, согласно принятым габаритам и конструктивным решениям в проекте;
2. В котловане изображены контуры проектируемых фундаментов и трубопровода;
3. Строительные категории грунтов при разработке механизмами следует принять, исходя из их плотности:

- для почвенно-растительного слоя - 1,2-1,4 тн/м3;
- для песчаного грунта - 1,58 тн/$м^3$

УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЯ:

Перед началом производства земляных работ по котловану под фундаменты приступить только после перенесения за пределы котлована или заглушения имеющихся в пределах контура котлована сетей и коммуникаций;

Перенос существующих подземных и наземных коммуникаций (технологические трубопроводы, водопроводные и электрические сети, газопроводные трубопроводы и т.д.) с площадки строительства должен осуществляться после согласования с инстанциями.

Необходимо выполнение общих вертикальных планировочных земляных работ на площадке.

Перед производством работ по заложению фундамента котлован должен быть освидетельствован инженером-геологом;

Примечание:

1. Песок мелкий с частицами из суглинка - группа грунта в зависимости от трудности их разработки механизированным способом (одноковшовыми экскаваторами) - I группа, (бульдозерами)- II группа, согласно таблице 1-1а, (вручную) - Iгруппа, согласно таблице 1-1в ШНК 4.02.01-04- «ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ» ДОПОЛНЕНИЯ И ПОПРАВКИ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

Внимание!

Обратную засыпку котлована выполнить до отметки 155,50.

Рев	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	09.09.2026	Выпущено для строительства		
R1	27.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-760503-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			09.09.26
Нач.отд.		Каршиев А.			09.09.26
Исполн.		Юлдашев Ж.			09.09.26
Н.контр		Кирпичников С.			09.09.26

ГАЗОПРОВОД "ГАЗЛИ-САРИМОЙ" (54 КМ) Линейный крановый узел DN1000 КУП-D7

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

План котлована

ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат / Format A2
